

# Nykirke-Barkåker

Reguleringsplan – status pr. 13. juni 2018

Plattform Vestfold 13.06.2018



# Status Nykirke – Barkåker pr. 13.06.2018

*Førstegangsbehandling* - januar/februar 2018

*Høring og offentlig ettersyn* 19.2. – 8.4.2018

- **Innsigelse 1** fra BN til rekkefølgekrav om P-hus
- **Innsigelse 2** fra SVV i påvente av godkjenning av rundkjøring på rv. 19

*Oversendelse til annengangsbehandling* - 27.04.2018


*Annengangsbehandling* - Horten og Re 5. juni og Tønsberg 8. juni 2018

- **1. Re kommune (DEN) vedtatt rådmannens innstilling om å trekke rekkefølgekrav til parkeringshus**
- **2. Pr. 13.06.18 avventes avklaring på rundkjøring rv. 19**

**Ønsket fremdrift; Omforent vedtak i kommunestyrene**


– Horten og Re **19. juni** og Tønsberg **20. juni 2018**

**Ibruktaking - 2024**

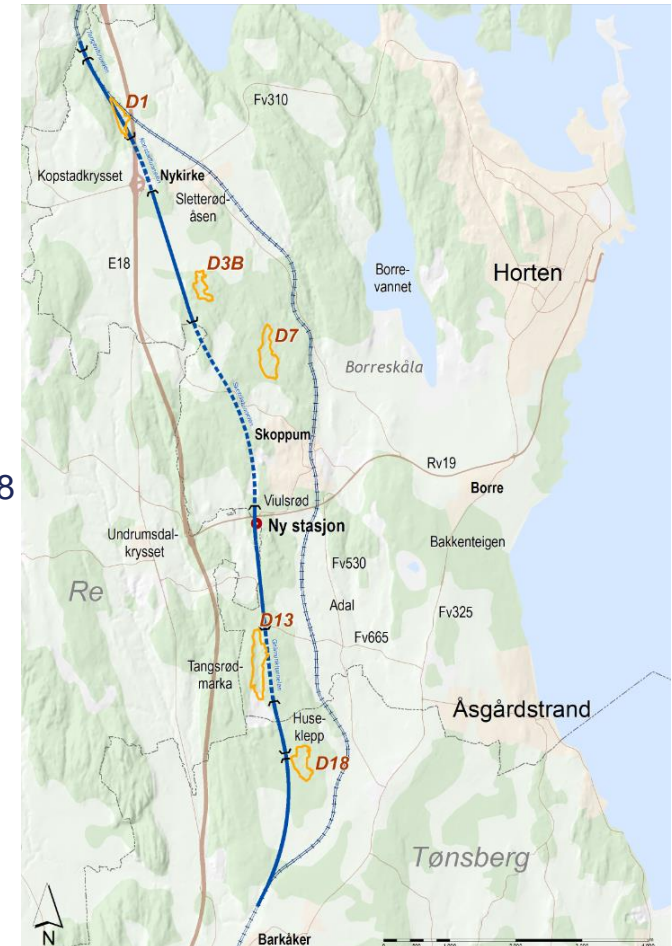



# Informasjon om Utbyggingsprosjekt Nykirke - Barkåker



Nettsider

[www.banenor.no/nykirke-barkaker/](http://www.banenor.no/nykirke-barkaker/)



Følg oss på Facebook

Bane NOR: Vestfoldbanen
